進捗報告（実行団体）

● 提　出　日　：　2022 年　10 月　12 日
● 事　業　名　：　「一人も取り残さない」ための包括的学習支援展開事業
　　― 拠点型・アウトリーチ型・オンライン型学習支援を組み合わせて ―
● 資金分配団体　：　公益財団法人日本国際交流センター
● 実 行 団 体　：　社会福祉法人さぽうとにじゅういち

① 実績値

【資金支援】

アウトプット	指標	目標値	達成時期	現在の指標の達成状況	進捗状況＊
１．（拠点型支援） 目黒教室で学習支援を実施する	実施回数、受講者数、継続率	①年 44 回/9 人 （新規 2 人、継続 7 人）/100% ②年 50 回/9 人 （新規 1 人、継続 8 人）/100% ③年 50 回/10 人 （新規 2 人、継続 8 人）/維持	①2020 年度末 ②2021 年度末 ③2022 年度末 （事業終了時）	合計 26 回、17 人（新規 7 人、継続 10 人）、延べ 217 人（8.3 人/回）、継続率 100%	2
１．（拠点型支援） 錦糸町教室で学習支援を実施する	実施回数、受講者数、継続率	①年 35 回/5 人 （新規 2 人、継続 3 人）/維持 ②年 52 回/9 人 （新規 2 人、継続 7 人）/維持 ②年 50 回/10 人 （新規 2 人、継続 8 人）/維持	①2020 年度末 ②2021 年度末 ③2022 年度末 （事業終了時）	合計 24 回、6 人（新規 2 人、継続 4 人）、延べ 105 人（4.4 人/回）、継続率 100%	2

１．（拠点型支援） 冬期休暇期間集中学習支援を実施する	実施回数、受講者数、継続率	①年 7 回/30 人/100% ②年 6 回/3 人 （新規 0 人、継続 3 人）/100% ③年 7 回/30 人 （新規 5 人、継続 25 人）/維持	①2020 年度末 （事業開始 1 年後） ②2021 年度末 ③2022 年度末 （事業終了時）	2022 年度分は 12 月末から 1 月初旬にかけて実施予定	4
２．（拠点型支援） 行徳教室で学習支援を実施する	実施回数、受講者数、継続率	①年 31 回/9 人/100% ②年 39 回/10 人 （新規 1 人、継続 9 人）/100% ③年 50 回/10 人 （新規 1 人、継続 9 人）/維持	①2020 年度末 （事業開始 1 年後） ②2021 年度末 ③2022 年度末 （事業終了時）	合計 26 回、13 人（新規 3 人、継続 10 人）、延べ 142 人（5.5 人/回）、継続率 100%	2
３．（アウトリーチ型支援） アウトリーチ型学習支援を実施する	新規アウトリーチ先、実施回数、受講者数、継続率	①1 箇所/各所・週 1 回/2 人/100% ②2 箇所/1 箇所目：46 回、2 箇所目：50 回/6 人/100% ③10 箇所/週 1 回/10 人/100%	①2020 年度末 （事業開始 1 年後） ②2021 年度末 ③2022 年度末 （事業終了時）	1 箇所：日本語学習支援・週 2 回（対面型＋オンライン型）	3
４．（オンライン型支援） オンライン型学習支援を実施する	実施回数、受講者数、継続率	①年 341 回/60 人/100% ②年 360 回/84 人 （新規 20 人、継続 64 人）/100% ③年 300 回/60 人 （新規 10 人、継続 50 人）/維持	①2020 年度末 （事業開始 1 年後） ②2021 年度末 ③2022 年度末 （事業終了時）	合計 183 回、53 人（新規 11 人、継続 42 人）、延べ 1799 人（9.8 人/回）、継続率 100%	2

５．（拠点型・アウトリーチ型・オンライン型支援）受講者向けに勉強会を実施する	①生活勉強会：実施回数、受講者数 ②ワークショップ：実施回数、受講者数	①年 10 回/各 5 人 ②年 3 回/各 10 日人	2022 年度末（事業終了時）	①20 代･30 代の若者を対象とし、9 月 7 日～10 月 5 日まで、毎週水曜 19 時 30 分～21 時に実施。全 5 回のうち、4 回分を実施済。延べ参加人数は 19 人。 残りについては、40 代～60 代の大人を対象とし、11 月 12 日～翌年 1 月 14 日まで、毎月第二・第四土曜 10 時～12 時に実施予定、全 5 回。 ②9 月 3 日（土）10 時～12 時に「防災ワークショップ」を実施、17 名（内訳：ミャンマー9 名、アフガニスタン 5 名、日本 3 名）が参加。 10 月 8 日（土）14 時～16 時に「健康ワークショップ」を実施予定。第三回は、テーマ・時期含め検討中。	2

６．（拠点型・アウトリーチ型・オンライン型支援）大学生学習支援者を増やす	参加者数	①25 人 ②43 人（新規 33 人、継続 10 人） ③25 人（新規 15 人、継続 10 人）	①2020 年度末（事業開始 1 年後） ②2021 年度末 ③2022 年度末（事業終了時）	14 人	2
６．（拠点型・アウトリーチ型・オンライン型支援）学習支援者勉強会を実施する	勉強会開催数、参加者数	年 2 回/各 20 人	各年度末	下期に、支援対象者や難民を取り巻く情勢等を学ぶことを目的にした勉強会を実施予定	3
６．（拠点型・アウトリーチ型・オンライン型支援）学習支援「開始者」向け研修１（団体概要の理解）を実施する	研修会開催数、参加者数	月 1～2 回以上／年間 40 人以上	各年度末	18 回（グループ 9 回、個別 9 回）、合計 39 人	2
６．（拠点型・アウトリーチ型・オンライン型支援）学習支援「開始者」向け研修２（スキルアップ）を実施する	研修会開催数、参加者数	年 4 回／各回 10 人以上	各年度末	開催できていないが、10 月、11 月、12 月、2 月実施にて計画中。支援スキルの獲得を目指した研修会とする	3

6．（拠点型・アウトリーチ型･オンライン型支援）「アセッサー」向け勉強会･研修会（DLA）を実施する	勉強会・研修会開催数、参加者数	年 5 回／各回 15 人以上	各年度末	開催できていないが、10 月から 2 月にかけて実施する計画で講師と検討中	3
7．拠点型・アウトリーチ型・オンライン型統合学習支援の成果を発表する	①報告書の作成、配布 ②ホームページ掲載する報告書のダウンロード数 ③シンポジウムの実施及び参加者数	①300 冊以上配布 ②100 件以上 ③1 回開催／参加者 50 人以上	2022 年度末（事業終了時）	サイトの準備完了。 2023 年 2 月 11 日（土）にシンポジウム実施予定にて、現在関係者との協議を進めている。	4
8．ホームページの特設サイトを活用し、当該事業や外国ルーツ青少年について等の情報発信を行う	コンテンツの配信回数	1 件/月	サイト公開から 2022 年度末の事業終了時	以下頻度で更新済。 3 月：3 件 5 月：1 件 7 月：1 件 9 月：1 件	3

＊進捗状況：1 計画より進んでいる 、2 計画どおり進んでいる 、3 計画より遅れている、4 その他

② 事業進捗に関する報告

1.事業計画に掲げた短期アウトカムの達成の見込み
2.概ね達成の見込み
2.アウトカムの状況
A：変更項目 ☑変更なし　☐短期アウトカムの内容　☐短期アウトカムの表現　☐短期アウトカムの指標　☐アウトカムの目標値
3.（任意）活動に関する報告

③ 広報に関する報告

1. シンボルマークの使用状況
☑自団体のウェブサイトで表示している　☐広報制作物に表示している ☐報告書に表示している　☐イベント実施時に表示している　☐その他 →「その他」を選択した場合は記載してください（自由記述）：
2. 広報
1.メディア掲載（TV・ラジオ・新聞・雑誌・WEB 等） ・2022 年 3 月 31 日に公開した特設サイトにおいて、当該事業に関することや、外国ルーツ青少年の声・支援者の想いが紹介されるページを制作し、定期的に発信していく。 https://support21.or.jp/people/ ・クーリエジャポン HP に、「「学習支援室は“私の実家”」難民の人生に伴走してきた日本語教師が語る「場づくり」の可能性」を掲載。 https://courrier.jp/columns/302062/?fbclid=IwAR1YspFZIr7JUpvuS_jl1VntkiyuwSRboNSWLTrgXUJYbgOXWfM5M9W2IFI 2.広報制作物等 特になし

3.報告書等

当団体の 2021 年度事業報告書

※2022 年 6 月に当団体ホームページに公開済

4.イベント開催等（シンポジウム、フォーラム等）

2023 年 2 月 11 日（土）にシンポジウムを実施予定。

添付資料

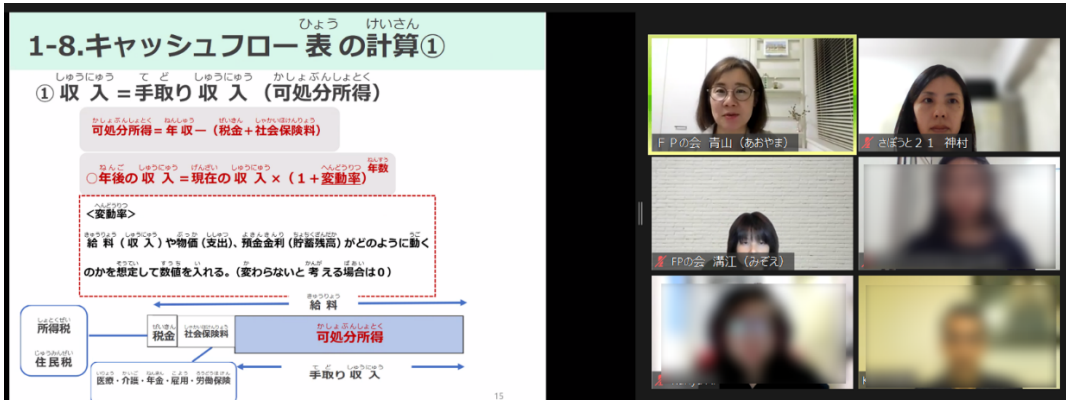

学習者向け勉強会（若者向け生活勉強会）

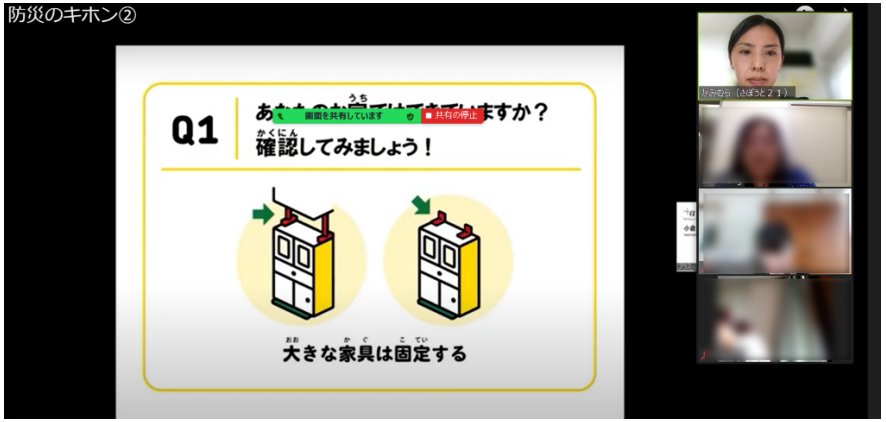

学習者向け勉強会（防災ワークショップ）
